TAMPICO ALTO
Me Encanta

N° de Acta:
2021301520018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN AYUNTAMIENTO- COMITE

En la localidad de **LA RIBERA** Siendo las **12:00** horas del día **16 de Diciembre de 2021**, Reunidos los representantes del:

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
C.C. Ing. Adrián Domínguez Rangel, C. María del Carmen Pecero Ramírez, Arq. Susana Yazmin China Gutiérrez, C. Cristina Escamilla Benítez, L.A.E. Cynthia Deneb Reyes Pérez, M.V.Z. Jesús Fernández Resendez, Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez y C. María del Rosario Hernández González; Presidente, Cabildo, Equipo Asesor y Vocal de Control y Vigilancia del C.D.M.

EL COMITÉ COMUNITARIO, representado por los:

C.C.	**YADIRA DELGADO SANCHEZ**	**LUIS ANTONIO RAMIREZ SOBREVILLA**
	MARIA DEL PILAR MASCAREÑAS SANCHEZ	**RAYMUNDO ANGELES BAUTISTA**
	EULALIO PEREZ ORTA	**EFRAIN PEREZ ARTEAGA**

Presidente, Secretario, Vocal y Suplentes del mismo, en representación de los beneficiarios de las obras y/o acciones mencionadas a continuación.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL **OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE**	DOMICILIO: **CALLE MANUEL AVILA CAMACHO NO. 207 INT A COL. PRIMAVERA C.P. 89130 TAMPICO, TAMPS.**
R.F.C. **MOPO8811242W6**	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: **C. OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE**

Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCIÓN** de la obra:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTSCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION FRANCISCO VILLA, EN LA RIBERA"

DATOS DE LA OBRA / ACCIÓN:

Número de Obra: **2021301520018**	Modalidad de Contratación: **Adjudicación Directa**	Invitación Restringida	Licitación Pública
No. de Anexo de Aprobación **FORTAMUNDF SENTENCIA 2021-AP/02**	Calendario de Obra:		
Monto del Contrato $ **565,550.00**	Fecha inicio: **23 DE NOVIEMBRE DEL 2021**	Fecha término: **10 DE DICIEMBRE DE 2021**	
No. de Contrato **MTA-DOP-2020301520018**	Nombre de la Compañía Afianzadora **LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.**		
Anticipo **0.00%** $ **0.00**	No. de fianza ----------	Fecha ----------	
Por Cumplimiento $ **56,555.00**	No. de fianza **2230445-0000**	Fecha **22-NOVIEMBRE-2021**	

TAMPICO ALTO
Me Encanta

Por Vicios Ocultos	No. de fianza	Fecha
$ 56,555.00	2223402-0000	13-DICIEMBRE-2020

INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN APLICADA			
TOTAL	FISMDF 2021	MUNICIPAL	COMUNIDAD	TOTAL	FISMDF 2021	MUNICIPAL	COMUNIDAD
$565,550.00	$ 565,550.00	$ 0.00	$ 0.00	$565,550.00	$ 565,550.00	$ 0.00	$ 0.00

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE DE ESTIMACIÓN C/IVA	MONTO
1 (UNO) FINAL	13-DICIEMBRE-2021	$ 565,550.00	$ 563,112.28

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

(Memoria Descriptiva)

El Proyecto consistió en la **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION FRANCISCO VILLA, EN LA RIBERA,** Mpio. de Tampico Alto, Ver., alcanzando las siguientes Metas:
185.14 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATO TOPOGRAFICO EN TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.
249.94 M3 CORTE PARA AMPLIACIÓN DE CORONA O ABRIR CAJA (EN ZONA URBANA) MATERIAL TIPO II A MAQUINA.
324.92 M3 CARGA A CAMION POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO A 5 KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
336.95 M3 OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE:
20217.29 KG SUMINISTRO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE CAL HIDRATADA PARA ESTABILIZAR LA BASE (MATERIAL INERTE) 60KG/M3.
185.14 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO CALIBRE 600 ALTA DENSIDAD.
5.9 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA COMUN EN FRONTERAS DE PAVIMENTACIÓN, INCLUYE. ACARREOS DE MATERIALES Y DECIMBRADO.
65.57 ML JUNTAS DE CONSTRUCCION CON VARILLA LISA DE 3/4" DE 1.20 MTS. A CADA 0.60 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.
185.14 M2 SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 DE 18.0 CM DE ESPESOR AGREGADO MAX. 3/4", INCLUYE: CURADO CON CURAFEST BLANCO O SIMILAR , ACABADO RALLADO INTEGRAL SOBRE CONCRETO FRESCO.
27.2 ML BORDILLO DE CONCRETO HIDRAULICO DE SECCION 15 X 15 CMS DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: CIMBRA DE MADERA DE PINO Y DECIMBRADO
27.2 M3 EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II-A DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
21.76 M3 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BASE EN BANQUETAS O GUARNICIONES EN FORMA MANUAL CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL DE BANCO.
27.2 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 6-6/1010 EN PISO DE CONCRETO.
27.2 M2 BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO AGREGADO MAXIMO 3/4" INCLUYE: CIMBRA Y DECIMBRADO
29.953 ML CALAFATEO EN PAVIMENTO , INCLUYE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE 4CMS DE ABERTURA, LIMPIEZA Y APLICACION DE ASFALTO EN LAS GRIETAS.
68 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIÓN (AMARILLO TRANSITO).
185.14 M2 LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS LOCALES.

El H. Ayuntamiento, ha designado a:

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMÁN MARQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. Ayuntamiento C
Tampico Alto, Ve.
Dirección de Ob
Públicas
2018 - 2021

C. ARQ. VICTOR MARIANO RANGEL GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

Técnicos encargados de Recibir la Obra, y

C. OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATADA

C. OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE
RESIDENTE DE OBRA

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen y estando de acuerdo en lo manifestado, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal y el Comité Comunitario quienes se comprometen a implementar mancomunadamente un Programa de Conservación y Mantenimiento de la misma.

El acto de recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de Obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho corresponda.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las **13:00** horas del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta en dos tantos, donde firman al margen y al calce de todas las hojas quienes intervinieron en ella.

E N T R E G A

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

Representante legal

C. OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE

Residente de obra

C. OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE

TAMPICO ALTO
Me Encanta

Hacemos el Cambio JUNTOS

RECIBE

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

PRESIDENTE

ING. ADRIAN DOMINGUEZ RANGEL

Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2018-2021

SINDICO ÚNICO

C. MARIA DEL CARMEN PECERO RAMIREZ

Único Ayuntamiento Constitucional Tampico Alto, Ver.

REGIDOR ÚNICIO

ARQ. SUSANA YAZMIN CHINA GUTIERREZ

REGIDORA Tampico Alto, Ver. 2018 - 2021

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. CRISTINA ESCAMILLA BENITEZ

Secretaria Municipal Ayuntamiento Const. Tampico Alto, Ver. 2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. CYNTHIA DENEB REYES PEREZ

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2018 - 2021

CONTRALOR MUNICIPAL

M.V.Z. JESUS FERNANDEZ RESENDEZ

Contraloría Ayuntamiento Constitucional Tampico Alto, Ver. 2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ

H. Ayuntamiento C Tampico Alto, Ve Dirección de Ob Públicas 2018 - 2021

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL C.D.M.

C. MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ GONZALEZ

POR EL COMITE COMUNITARIO

PRESIDENTE (A)

C. YADIRA DELGADO SANCHEZ

SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)

C. LUIS ANTONIO RAMIREZ SOBREVILLA

SECRETARIO (A)

C. MARIA DEL PILAR MASCAREÑAS SANCHEZ

SUPLENTE DE SECRETARIO (A)

C. RAYMUNDO ANGELES BAUTISTA

VOCAL

C. EULALIO PEREZ ORTA

SUPLENTE DEL (A) VOCAL

C. EFRAIN PEREZ ARTEAGA

AL FINAL :

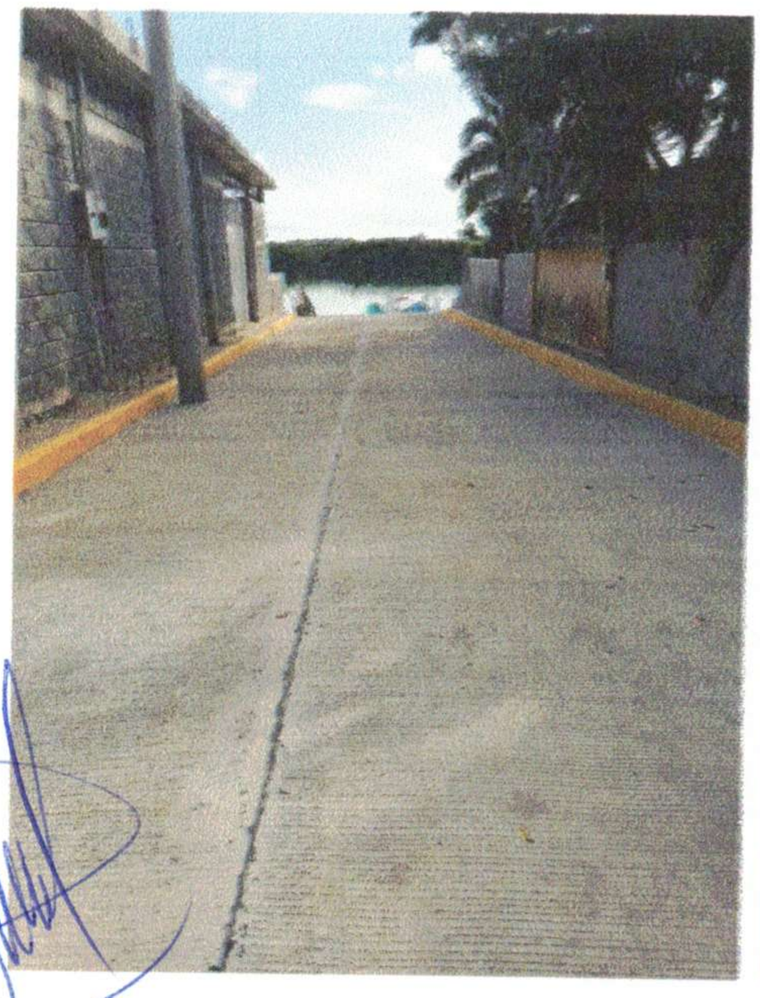
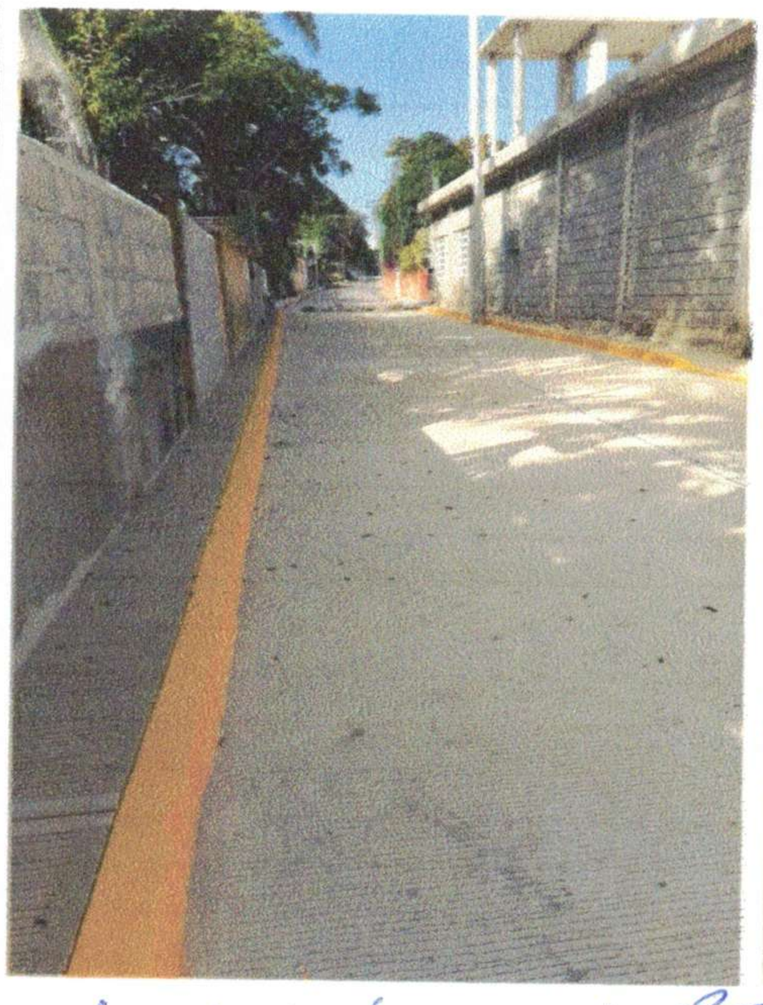
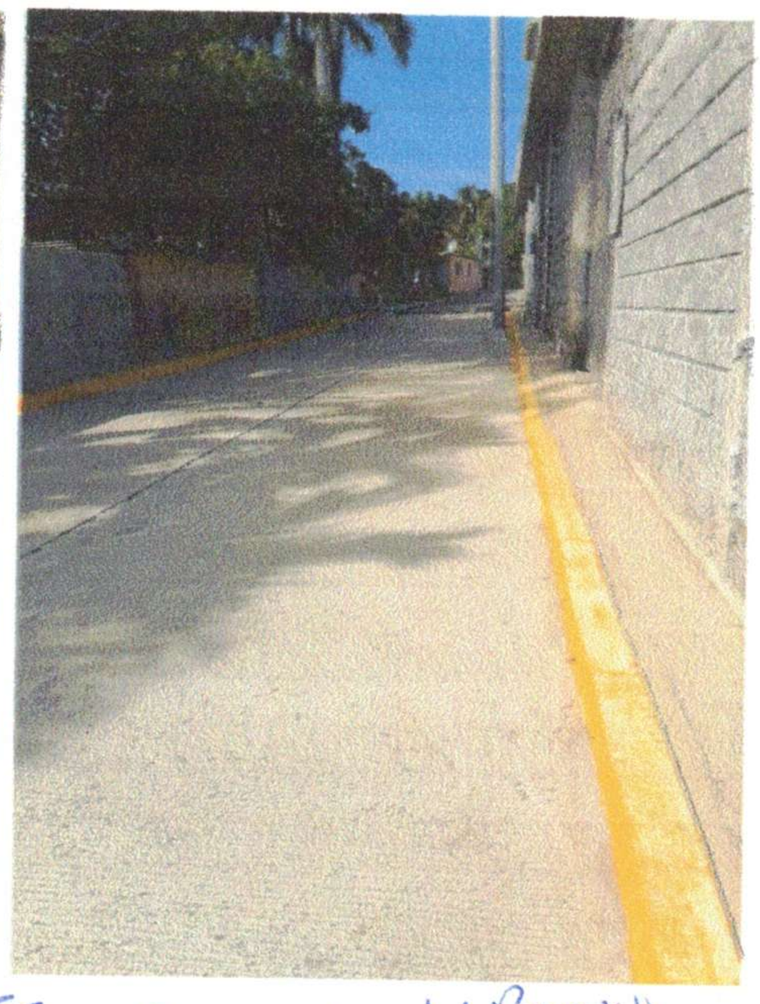

Yadira Delgado Sanchez
Mª del Pilar
Luis A. Ramírez S.
Ma del Rosario
